Календарный план №0012
Организация производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов на базе СППК «СПАРК»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Организационного штаба управления проектами
_____ Р.Р. Пальталлер
"__" _____2016г.

№	СДР	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Исполнитель	% заверш.
0	0	**Проект №0012 Организация производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов на базе СППК «СПАРК»**	**260 дней**	**Пт 01.01.16**	**Пт 30.12.16**		**88%**
1	1	**Начало проекта**	**0 дней**	**Пт 01.01.16**	**Пт 01.01.16**	**Смирнов В.А.**	**100%**
2	2	**Подготовительные работы**	**20 дней**	**Пт 01.01.16**	**Чт 28.01.16**	**Смирнов В.А.**	**100%**
3	2.1	Анализ рынка отрасли	5 дней	Пт 01.01.16	Чт 07.01.16	Смирнов В.А.	100%
4	2.1.1	Анализ сырьевой базы	3 дней	Пт 01.01.16	Чт 07.01.16	Смирнов В.А.	100%
5	2.1.2	Характеристика потребителей	3 дней	Пт 01.01.16	Вт 05.01.16	Смирнов В.А.	100%
6	2.2	Оформление имущества СПО "Усть-Коксинское" в собственность СППК "СПАРК"	20 дней	Пт 01.01.16	Чт 28.01.16	Смирнов В.А.	100%
7	2.2.1	Заключение договора купли - продажи недвижимого имущества и оборудования	15 дней	Пт 01.01.16	Чт 21.01.16	Смирнов В.А.;СПО "Усть-Коксинское"	100%
8	2.2.2	Перевод имущества на баланс СППК "СПАРК"	5 дней	Пт 22.01.16	Чт 28.01.16	Тетерина Т. В	100%
9	2.3	Разработка технического задания для организации производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов	15 дней	Пт 01.01.16	Чт 21.01.16	Смирнов В.А.;Тетерина Т. В	100%
10	2.4	Недвижимое имущество и оборудование СПО "Усть-Коксинское" переданы в собственность СППК "СПАРК"	0 дней	Чт 28.01.16	Чт 28.01.16	Смирнов В.А.	100%
11	3	**Реконструкция производственного помещения**	**161 дней**	**Чт 21.01.16**	**Пт 02.09.16**	**Смирнов В.А.,Тетерина Т. В**	**69%**
12	3.1	Разработка проектно-сметной документации для реконструкции производственного помещения для размещения цеха по производству колбасных изделий и мясных полуфабрикатов на базе СППК «СПАРК»	15 дней	Чт 21.01.16	Чт 11.02.16	Смирнов В.А.;Тетерина Т. В	100%
13	3.2	Проведение капитального ремонта производственных помещений с временнойостановкой действующего производства	20 дней	Пн 08.08.16	Пт 02.09.16	Богданов А.	10%
14	3.3	Проведена реконструкция производственного помещения	0 дней	Пт 02.09.16	Пт 02.09.16	Богданов А.	100%
15	4	**Приобретение и монтаж нового оборудования**	**11 дней**	**Пн 11.01.16**	**Пн 25.01.16**	**ООО "АгроБизнесПартнер";С В.А.**	**100%**
16	4.1	Заключение договора на поставку оборудования	2 дней	Пн 11.01.16	Вт 12.01.16	Смирнов В.А.;ООО "АгроБизнесПартнер"	100%
17	4.2	Поставка оборудования	2 дней	Ср 13.01.16	Чт 14.01.16	ООО "АгроБизнесПартнер"	100%
18	4.3	Доставка оборудования до места назначения	3 дней	Пт 15.01.16	Вт 19.01.16	ООО "АгроБизнесПартнер"	100%
19	4.4	Монтаж оборудования	2 дней	Ср 20.01.16	Чт 21.01.16	Смирнов В.А.	100%
20	4.5	Проверка качества и комплектности оборудования	2 дней	Пт 22.01.16	Пн 25.01.16	Смирнов В.А.	100%
21	4.6	Приобретено и смонтировано оборудование для производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов	0 дней	Пн 25.01.16	Пн 25.01.16	Смирнов В.А.	100%
22	5	**Организация производства**	**15 дней**	**Пт 01.01.16**	**Чт 18.02.16**	**Смирнов В.А.**	**100%**
23	5.1	Пуско-наладочные работы	5 дней	Вт 26.01.16	Пн 01.02.16	Смирнов В.А.	100%
24	5.2	Обеспечение кадровыми ресурсами	22 дней	Пт 01.01.16	Пн 01.02.16	Смирнов В.А.	100%
25	5.3	Разработка маркетингового плана продукции	15 дней	Пт 08.01.16	Чт 28.01.16	Смирнов В.А.;Тетерина Т. В	100%
26	5.4	Разработка плана реализации продукции (плана сбыта)	15 дней	Пт 29.01.16	Чт 18.02.16	Смирнов В.А.;Тетерина Т. В	100%
27	5.5	Запуск в производство нового оборудования	0 дней	Пн 01.02.16	Пн 01.02.16	Смирнов В.А.	100%
28	6	**Запуск производства в отремонтированном помещении**	**0 дней**	**Пт 02.09.16**	**Пт 02.09.16**	**Смирнов В.А.**	**0%**
29	7	**Вывод предприятия на проектную мощность**	**0 дней**	**Пт 30.12.16**	**Пт 30.12.16**	**Смирнов В.А.**	**0%**
30	8	**Окончание проекта**	**0 дней**	**Пт 30.12.16**	**Пт 30.12.16**	**Смирнов В.А.**	**75%**

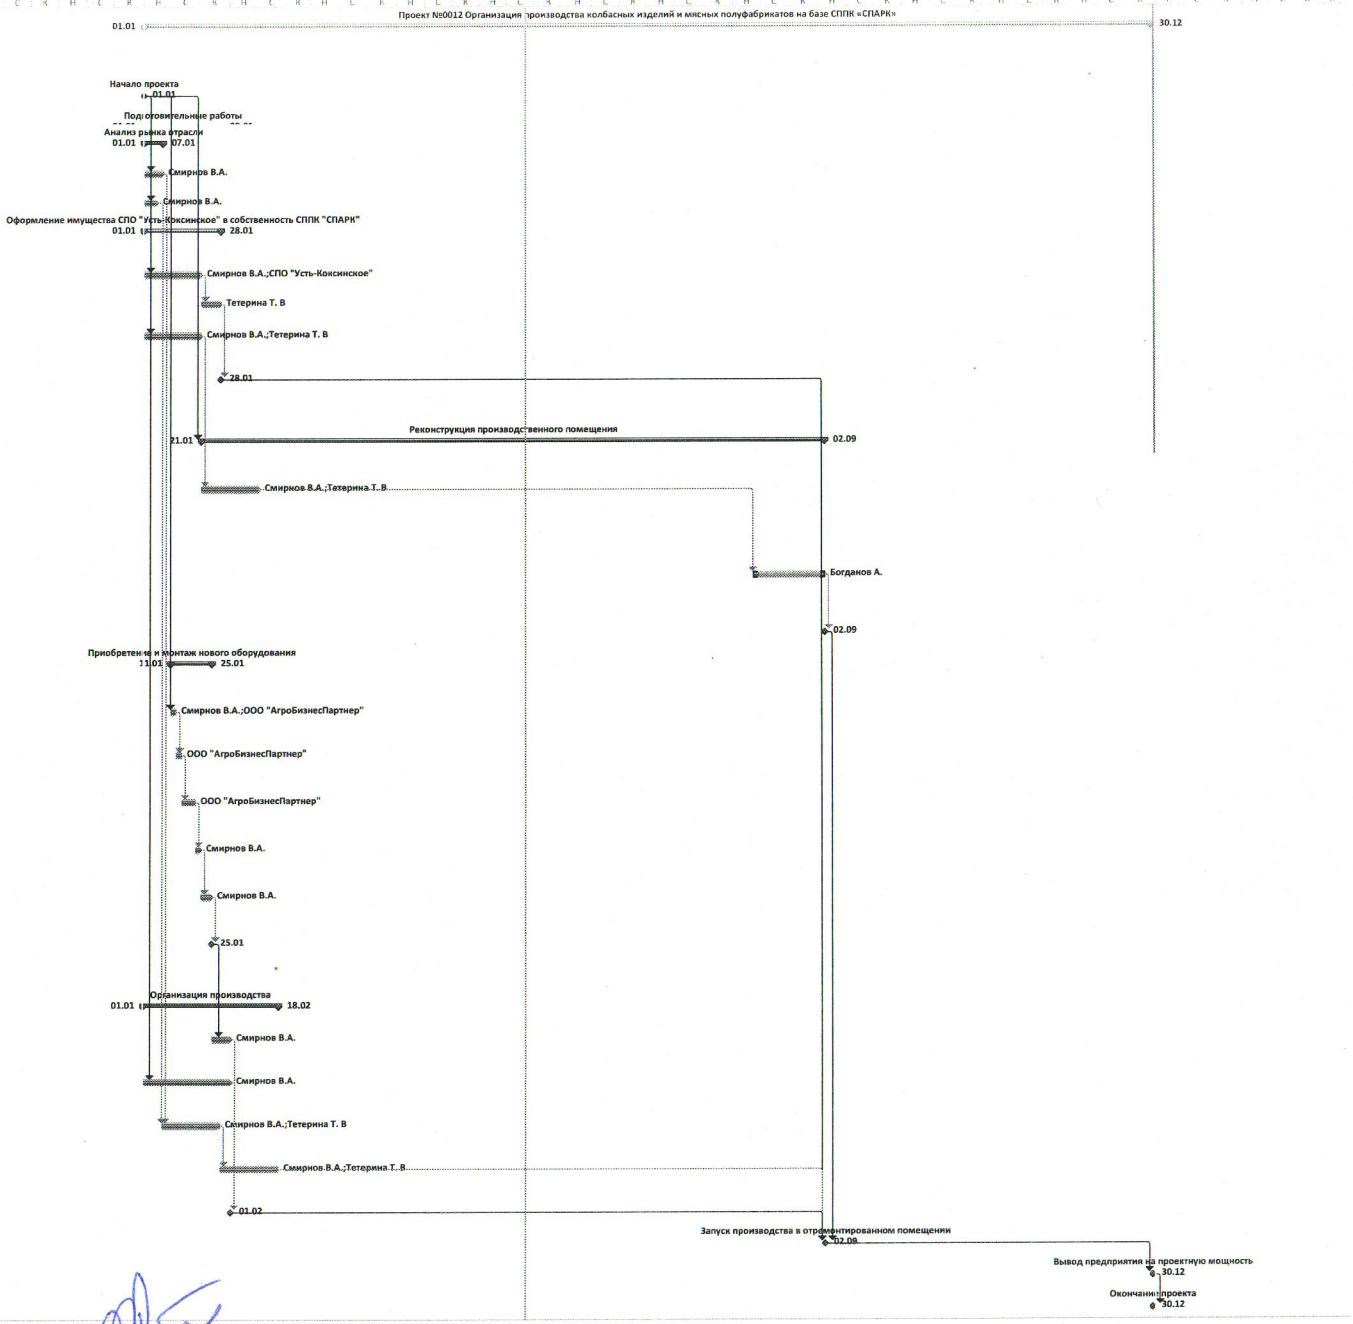

Согласовано:
Куратор проекта _____Закладов А.А. Заказчик проекта _____Смирнов В.А. "__"____2016 г. Руководитель проекта _____Арсланов А.К. "__"____2016 г. Руководитель Проектного офиса _____ Ротарь Ф.Н. "__"____2016 г.
